# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-14-Restauration de berge**

BAYENGHEM LES SENINGHEM

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et 2012*

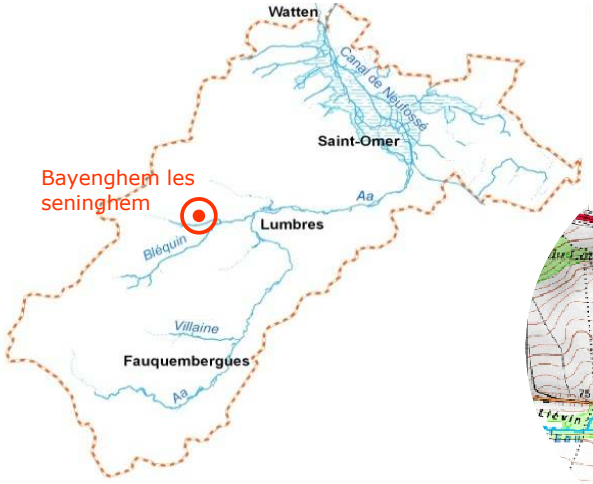


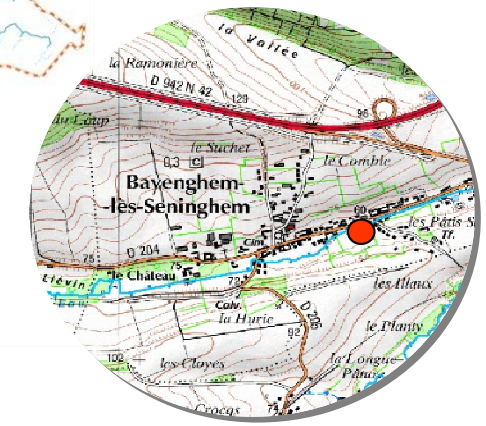


- **Objectifs** → Restaurer une berge communale
- **Actions réalisées** → retrait d'une protection de berges en tôles et traverses, retalutage, plantation d'hélophytes et de saules pré-formé têtard.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

- **Commune** → Bayenghem les seninghem (62)
- **Cours d'eau** → Urne à l'eau
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 3 595 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 62 m
- **Linéaire planté** → 50 m
- **Essences** → Viorne obier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Saule blanc.
- **Linéaire hélophytes planté** → 60m, Grande Glycérie, Salicaire, Iris faux acore, Laiche des marais, Reine des prés, Populage des marais

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-15-Plantations et clôtures**

REMILLY-WIRQUIN

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et 2012*

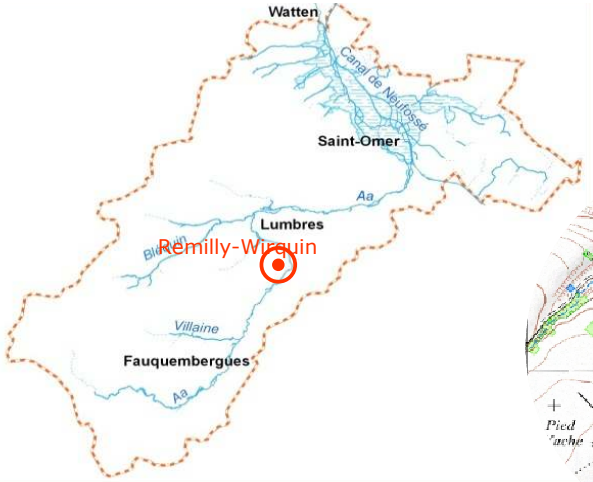


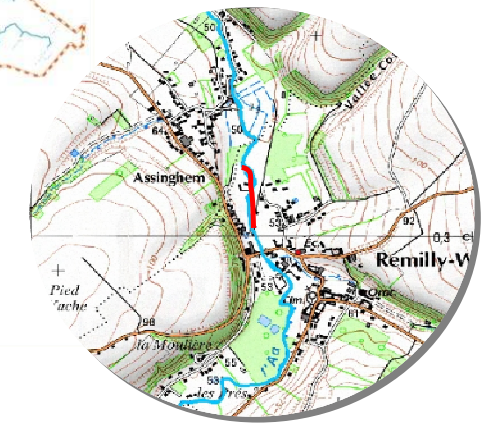


- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Plantations de ripisylve, protection par clôture et mise en place d'abreuvoirs.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations et fauche des chardons dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

- **Commune** → Remilly-Wirquin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 6 000 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 200 m
- **Linéaire planté** → 120 m
- **Linéaire de clôture** → 190 m et 3 abreuvoirs ouverts aménagés
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-16-Plantations et clôtures**

RUMILLY

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et 2011*

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Création de ripisylve et protection par clôtures barbelées.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

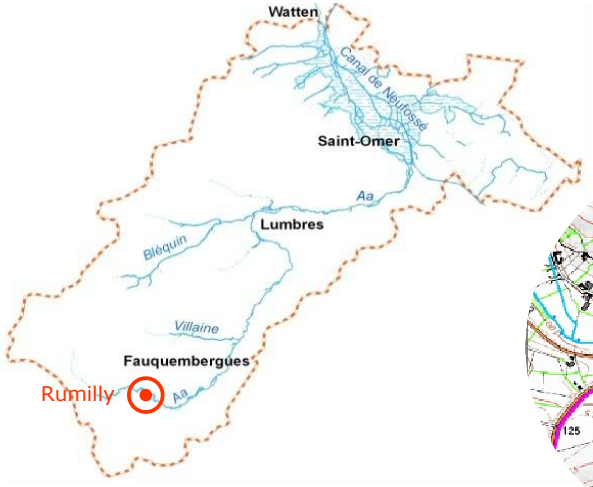


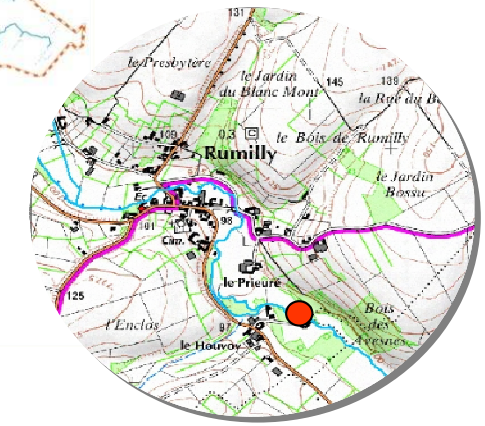


- **Commune** → Rumilly (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 1 710 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 100 m
- **Linéaire planté** → 70 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 100 m

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-17-Plantations et clôtures**

RENTY

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et 2012*

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Plantations de ripisylve, protection par clôture et mise en place d'abreuvoirs.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

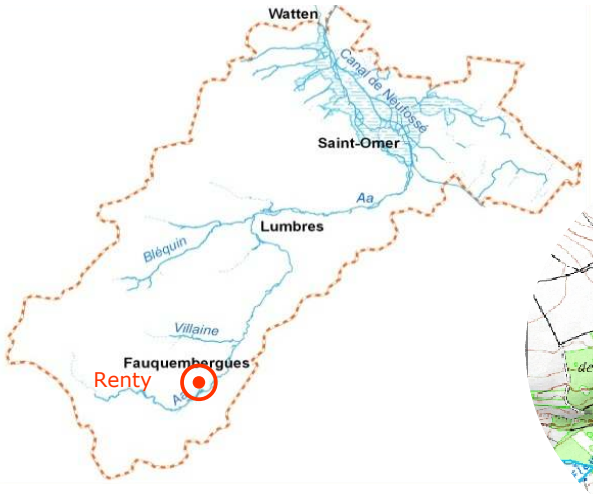


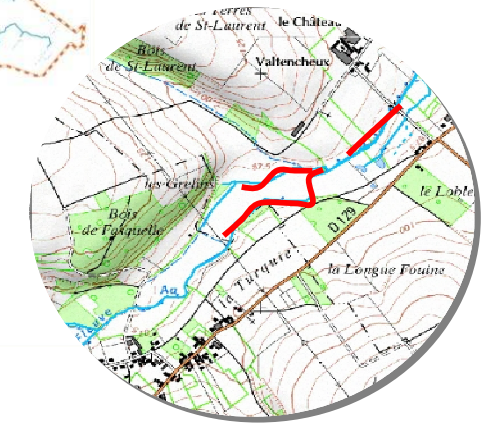


- **Commune** → Renty (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 19 374 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 1 210 m
- **Linéaire planté** → 385 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc.
- **Linéaire de clôture** → 1 085 m, 3 abreuvoirs ouverts aménagés et 1 buvette posée
- **Linéaire hélophytes planté** → 200 m, Grande Glycérie, Salicaire, Iris faux acore, Laiche des marais, Reine des prés, Populage des marais

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-18-Plantations et clôtures**

RENTY

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et 2012*

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Création de ripisylve et protection par une clôture barbelée
- **Travaux complémentaires** → Protection et modification de franchissement d'un petit ruisseau
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

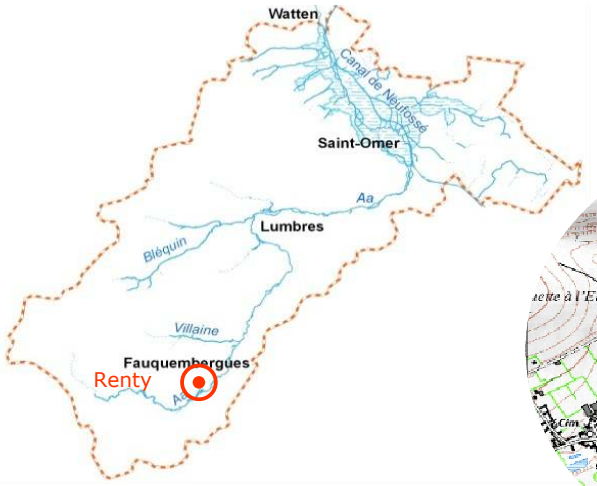


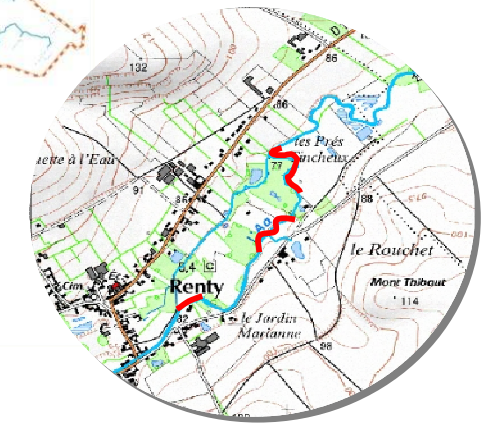


- **Commune** → Renty (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 10 680 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 700 m
- **Linéaire planté** → 160 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc.
- **Linéaire de clôture** → 677 m, 3 buvettes posées

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-19-Restauration de berges, plantations et clôtures** VERCHOCQ

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2010 et en 2012*

- **Objectifs** → Restaurer les berges
- **Actions réalisées** → Protection de berges par fascinage, création de ripisylve et protection par clôture barbelé.
- **Travaux complémentaires** → Modification de franchissement d'un petit ruisseau
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

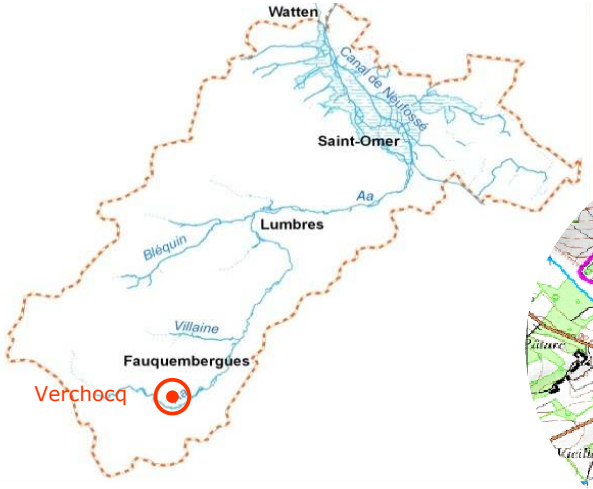


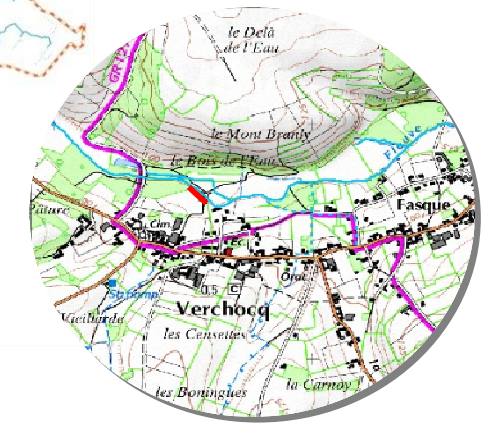


- **Commune** → Verchocq (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 10 070 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 120 m
- **Linéaire planté** → 80 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 110 m, 1 abreuvoir ouvert aménagé
- **Protection de berges** → 40 m de fascinage de saule

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012

# Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-20-Clôtures**

WAVRANS SUR l'AA

## CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2011

*Le site en 2009 et en 2012*

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Mise en place d'une clôture et remise en état d'un abreuvoir
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

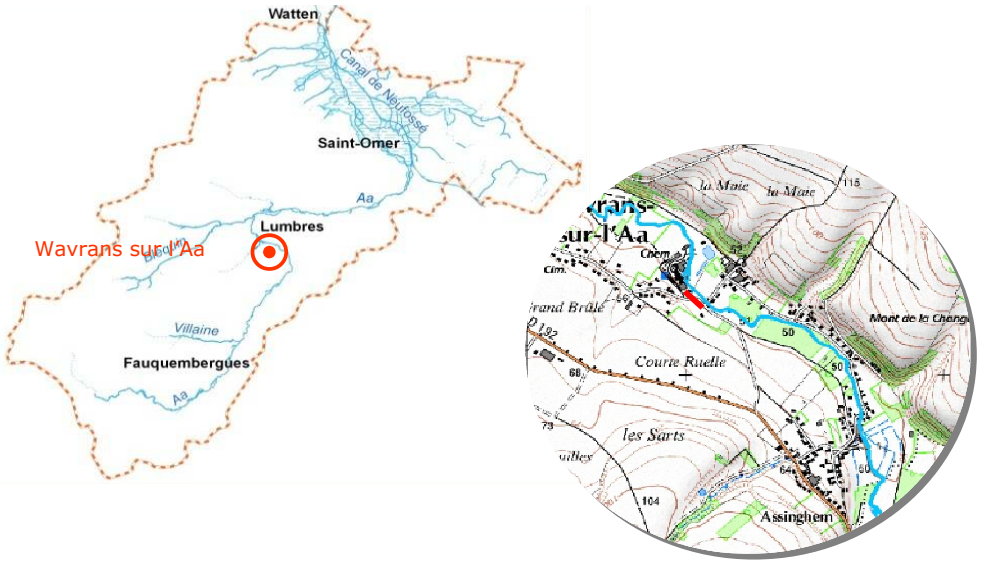


- **Commune** → Wavrans sur l'Aa (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 1 700 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 70 m
- **Linéaire de clôture** → 70 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Frêne commun, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.

## DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

Mise à jour le 15/09/2012
